

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Segundo Trimestre 2024 del Instituto Tecnológico de Sonora

ENTIDAD	CICLO	MO	PP	RENDIMIENTO	REINTEGRO	PG	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
Sonora	2023	U	6	-	922,849.39								
Sonora	2023	U	6			362	-	106,049.52	-	106,049.52	106,049.52	106,049.52	106,049.52
Sonora	2023	U	6			255	-	264,667.96	-	264,667.96	264,667.96	264,667.96	264,667.96
Sonora	2023	U	6			254	-	23,032.96	-	23,032.96	23,032.96	23,032.96	23,032.96
Sonora	2023	U	6			256	-	64,488.43	-	64,488.43	64,488.43	64,488.43	64,488.43
Sonora	2023	U	6			252	-	61,603.92	-	61,603.92	61,603.92	61,603.92	61,603.92
Sonora	2023	U	6			251	-	12,240.12	-	12,240.12	12,240.12	12,240.12	12,240.12
Sonora	2023	U	6			237	-	32,149.31	-	32,149.31	32,149.31	32,149.31	32,149.31
Sonora	2023	U	6			223	-	1,949.91	-	1,949.91	1,949.91	1,949.91	1,949.91
Sonora	2023	U	6			242	-	135,184.86	-	135,184.86	135,184.86	135,184.86	135,184.86
Sonora	2023	U	6			247	-	582,242.59	-	582,242.59	582,242.59	582,242.59	582,242.59
Sonora	2023	U	6			231	-	10,400.07	-	10,400.07	10,400.07	10,400.07	10,400.07
Sonora	2023	U	6			221	-	8,045.95	-	8,045.95	8,045.95	8,045.95	8,045.95
Sonora	2023	U	6			241	-	39,055.12	-	39,055.12	39,055.12	39,055.12	39,055.12
Sonora	2023	U	6			246	-	1,580,017.01	-	1,580,017.01	1,580,017.01	1,580,017.01	1,580,017.01
Sonora	2023	U	6			248	-	886,491.62	-	886,491.62	886,491.62	886,491.62	886,491.62
Sonora	2023	U	6			249	-	1,733,700.78	-	1,733,700.78	1,733,700.78	1,733,700.78	1,733,700.78
Sonora	2023	U	6			216	-	2,410,493.37	-	2,410,493.37	2,410,493.37	2,410,493.37	2,410,493.37
Sonora	2023	U	6			214	-	230.22	-	230.22	230.22	230.22	230.22
Sonora	2023	U	6			211	-	29,999.24	-	29,999.24	29,999.24	29,999.24	29,999.24
Sonora	2023	U	6			171	-	6,127,431.06	-	6,127,431.06	6,127,431.06	6,127,431.06	6,127,431.06
Sonora	2023	U	6			359	-	58,858.40	-	58,858.40	58,858.40	58,858.40	58,858.40
Sonora	2023	U	6			259	-	72,797.30	-	72,797.30	72,797.30	72,797.30	72,797.30
Sonora	2023	U	6			351	-	26,185,004.14	-	26,185,004.14	26,185,004.14	26,185,004.14	26,185,004.14
Sonora	2023	U	6			352	-	191,000.00	-	191,000.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00
Sonora	2023	U	6			353	-	2,582,221.69	-	2,582,221.69	2,582,221.69	2,582,221.69	2,582,221.69
Sonora	2023	U	6			355	-	230,550.00	-	230,550.00	230,550.00	230,550.00	230,550.00
Sonora	2023	U	6			358	-	1,118,993.43	-	1,118,993.43	1,118,993.43	1,118,993.43	1,118,993.43
Sonora	2023	U	6			317	-	205,869.00	-	205,869.00	205,869.00	205,869.00	205,869.00
Sonora	2023	U	6			261	-	782,694.40	-	782,694.40	782,694.40	782,694.40	782,694.40

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Segundo Trimestre 2024 del Instituto Tecnológico de Sonora

Sonora	2023	U	6			272	-	119,229.98	-	119,229.98	119,229.98	119,229.98	119,229.98
Sonora	2023	U	6			291	-	399,214.76	-	399,214.76	399,214.76	399,214.76	399,214.76
Sonora	2023	U	6			292	-	784,279.06	-	784,279.06	784,279.06	784,279.06	784,279.06
Sonora	2023	U	6			293	-	1,768.96	-	1,768.96	1,768.96	1,768.96	1,768.96
Sonora	2023	U	6			294	-	691,187.83	-	691,187.83	691,187.83	691,187.83	691,187.83
Sonora	2023	U	6			295	-	41,430.10	-	41,430.10	41,430.10	41,430.10	41,430.10
Sonora	2023	U	6			296	-	36,544.37	-	36,544.37	36,544.37	36,544.37	36,544.37
Sonora	2023	U	6			298	-	414,497.60	-	414,497.60	414,497.60	414,497.60	414,497.60
Sonora	2023	U	6			299	-	81,619.85	-	81,619.85	81,619.85	81,619.85	81,619.85
Sonora	2023	U	6			313	-	14,005.73	-	14,005.73	14,005.73	14,005.73	14,005.73
Sonora	2023	U	6			315	-	687.00	-	687.00	687.00	687.00	687.00
Sonora	2023	U	6			327	-	1,402,963.12	-	1,402,963.12	1,402,963.12	1,402,963.12	1,402,963.12
Sonora	2023	U	6			331	-	12,064.00	-	12,064.00	12,064.00	12,064.00	12,064.00
Sonora	2023	U	6			336	-	110,348.66	-	110,348.66	110,348.66	110,348.66	110,348.66
Sonora	2023	U	6			338	-	1,618,215.08	-	1,618,215.08	1,618,215.08	1,618,215.08	1,618,215.08
Sonora	2024	U	6	3,948,763.88	-								
Sonora	2024	U	6			293	200,831.40	233,588.17	160,000.00	2,734.68	587.96	587.96	587.96
Sonora	2024	U	6			294	428,096.90	473,913.80	350,566.00	319,826.83	319,826.83	319,826.83	319,535.19
Sonora	2024	U	6			295	55,000.00	48,643.87	45,000.00	7,857.30	7,857.30	7,857.30	7,857.30
Sonora	2024	U	6			296	237,964.25	280,502.38	200,234.00	61,820.19	60,588.24	60,588.24	60,588.24
Sonora	2024	U	6			298	2,971,400.73	1,139,220.47	957,530.00	71,989.88	66,565.90	66,565.90	64,977.76
Sonora	2024	U	6			299	215,655.90	268,690.33	230,000.00	91,263.95	90,646.83	90,646.83	64,749.39
Sonora	2024	U	6			311	33,482,151.96	33,402,151.96	27,155,812.12	11,742,787.00	11,742,787.00	11,742,787.00	11,742,787.00
Sonora	2024	U	6			312	-	160,693.98	115,000.00	123,162.93	114,579.81	114,579.81	114,579.81
Sonora	2024	U	6			313	4,821,985.00	4,779,249.83	3,700,000.00	2,265,313.50	1,916,639.01	1,916,639.01	1,916,639.01
Sonora	2024	U	6			315	23,296.00	26,444.00	25,000.00	11,304.00	11,304.00	11,304.00	11,304.00
Sonora	2024	U	6			322	26,300.00	22,940.00	22,700.00	3,500.00	-	-	-
Sonora	2024	U	6			323	42,572.00	26,477.00	22,500.00	9,947.00	9,947.00	9,947.00	9,947.00
Sonora	2024	U	6			325	99,100.00	80,000.00	80,000.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00
Sonora	2024	U	6			326	45,000.00	36,770.42	35,000.00	928.00	928.00	928.00	928.00
Sonora	2024	U	6			327	6,918,789.63	9,428,867.63	8,150,000.00	9,260,619.74	5,019,703.80	5,019,703.80	5,019,703.80

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Segundo Trimestre 2024 del Instituto Tecnológico de Sonora

Sonora	2024	U	6			328	8,500.00	-	-	-	-	-	-
Sonora	2024	U	6			329	21,800.00	55,195.26	42,000.00	49,773.48	49,425.48	49,425.48	49,425.48
Sonora	2024	U	6			331	387,000.00	315,177.64	310,000.00	80,086.35	18,797.84	18,797.84	18,797.84
Sonora	2024	U	6			333	598,765.00	579,765.00	450,000.00	575,045.64	561,904.00	561,904.00	561,904.00
Sonora	2024	U	6			334	19,343.00	100,873.00	89,000.00	10,605.98	10,605.98	10,605.98	10,605.98
Sonora	2024	U	6			336	2,545,278.80	2,133,284.47	2,100,000.00	655,097.02	529,057.66	529,057.66	487,137.66
Sonora	2024	U	6			338	22,006,416.84	21,786,416.84	20,500,000.00	21,063,885.52	8,017,047.68	8,017,047.68	8,017,047.68
Sonora	2024	U	6			339	5,151,297.53	2,808,879.28	1,300,000.00	1,680,585.08	1,328,685.08	1,328,685.08	1,328,685.08
Sonora	2024	U	6			259	2,333,029.39	2,152,145.25	2,100,000.00	765,177.17	721,246.50	721,246.50	721,246.50
Sonora	2024	U	6			159	647,597.00	688,876.01	622,000.00	217,387.78	186,142.00	186,142.00	186,142.00
Sonora	2024	U	6			171	25,143,932.00	24,417,505.00	9,000,000.00	24,417,505.00	5,736,326.60	5,736,326.60	5,736,326.60
Sonora	2024	U	6			392	838,952.74	913,257.78	910,000.00	572,259.00	545,591.00	545,591.00	545,322.00
Sonora	2024	U	6			398	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	10,739,835.36	10,739,835.36	10,739,835.36	10,739,835.36
Sonora	2024	U	6			359	963,155.68	963,155.68	500,155.00	712,260.88	544,883.32	544,883.32	488,994.52
Sonora	2024	U	6			362	-	222,400.00	1,500.00	1,899.77	1,899.77	1,899.77	1,199.92
Sonora	2024	U	6			364	-	174.00	100.00	169.00	169.00	169.00	169.00
Sonora	2024	U	6			371	624,435.03	776,890.91	639,153.59	252,451.54	113,209.54	113,209.54	113,209.54
Sonora	2024	U	6			372	33,650.00	39,990.00	35,790.00	7,349.85	7,349.85	7,349.85	6,508.65
Sonora	2024	U	6			375	859,935.77	1,019,227.53	1,000,000.00	403,071.29	188,024.14	188,024.14	188,024.14
Sonora	2024	U	6			379	193,010.00	417,112.00	400,000.00	147,418.78	64,821.78	64,821.78	63,585.78
Sonora	2024	U	6			381	8,000.00	3,660.50	3,500.00	3,600.47	3,600.47	3,600.47	3,114.95
Sonora	2024	U	6			383	344,310.00	267,555.00	230,555.00	238,750.00	109,624.00	109,624.00	109,624.00
Sonora	2024	U	6			345	-	13,405.00	1,200.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00
Sonora	2024	U	6			347	19,685.00	24,495.00	23,000.00	1,643.68	1,643.68	1,643.68	1,643.68
Sonora	2024	U	6			351	6,287,027.44	11,809,631.51	10,315,000.00	1,127,703.04	613,869.44	613,869.44	536,659.84
Sonora	2024	U	6			352	1,257,432.51	822,451.09	780,000.00	13,360.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00
Sonora	2024	U	6			353	16,092,648.55	15,988,746.55	15,000,000.00	13,433,286.50	3,985,344.60	3,985,344.60	3,985,344.60
Sonora	2024	U	6			354	1,245,000.00	1,229,862.80	1,015,000.00	1,167,652.75	-	-	-
Sonora	2024	U	6			355	3,254,617.00	2,998,525.35	2,100,000.00	544,355.88	537,869.31	537,869.31	518,755.99
Sonora	2024	U	6			357	943,489.10	1,241,454.66	1,135,000.00	824,272.01	397,843.41	397,843.41	397,843.41
Sonora	2024	U	6			358	21,169,833.14	21,171,833.14	21,070,800.00	20,946,487.23	6,928,513.28	6,928,513.28	6,909,309.48

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Segundo Trimestre 2024 del Instituto Tecnológico de Sonora

Sonora	2024	U	6			317	5,492,910.00	5,492,910.00	4,400,000.00	5,492,308.92	2,288,462.05	2,288,462.05	2,287,913.05
Sonora	2024	U	6			318	165,800.00	161,093.28	130,400.00	22,258.42	15,258.42	15,258.42	15,258.42
Sonora	2024	U	6			344	2,053,490.85	2,071,451.45	2,030,000.00	2,060,579.71	1,312,039.09	1,312,039.09	1,312,039.09
Sonora	2024	U	6			261	3,800,466.46	2,613,399.10	2,500,000.00	1,569,316.89	1,503,769.51	1,503,769.51	1,503,091.50
Sonora	2024	U	6			271	1,752,622.00	1,765,810.00	1,350,000.00	1,430,644.32	852,374.44	852,374.44	616,073.98
Sonora	2024	U	6			272	621,191.20	699,370.92	500,000.00	437,823.44	361,924.64	361,924.64	186,550.38
Sonora	2024	U	6			273	936,421.00	725,436.58	700,000.00	90,571.78	89,071.78	89,071.78	11,427.18
Sonora	2024	U	6			274	27,100.00	80,600.00	50,000.00	61,639.88	36,219.27	36,219.27	36,219.27
Sonora	2024	U	6			275	16,723.20	16,723.20	15,000.00	-	-	-	-
Sonora	2024	U	6			291	1,005,442.01	909,653.57	750,000.00	81,855.51	79,839.52	79,839.52	78,445.45
Sonora	2024	U	6			292	459,766.20	794,562.80	450,000.00	61,748.00	36,022.80	36,022.80	36,022.80
Sonora	2024	U	6			113	105,253,167.00	97,259,579.98	88,000,000.00	97,259,579.98	51,220,976.75	51,220,976.75	51,220,976.75
Sonora	2024	U	6			255	1,113,606.21	2,154,054.19	2,100,000.00	1,509,268.10	1,029,806.98	1,029,806.98	919,397.01
Sonora	2024	U	6			254	400,618.91	143,802.91	128,000.00	1,687.03	1,687.03	1,687.03	1,687.03
Sonora	2024	U	6			256	135,500.49	313,122.17	220,000.00	23,489.89	23,489.89	23,489.89	23,428.26
Sonora	2024	U	6			253	545,049.92	589,993.38	500,943.00	178,379.80	178,379.80	178,379.80	178,379.80
Sonora	2024	U	6			252	120,991.62	160,121.17	100,400.00	30,235.00	23,235.00	23,235.00	23,235.00
Sonora	2024	U	6			251	159,181.00	120,075.90	110,000.00	4,255.03	4,255.03	4,255.03	4,255.03
Sonora	2024	U	6			222	22,000.00	20,700.00	18,000.00	696.00	696.00	696.00	696.00
Sonora	2024	U	6			237	-	6,501.80	6,501.00	-	-	-	-
Sonora	2024	U	6			223	104,764.03	94,541.23	70,800.00	14,976.03	13,729.49	13,729.49	11,291.59
Sonora	2024	U	6			232	-	1,728.00	1,700.00	-	-	-	-
Sonora	2024	U	6			242	35,989.00	55,487.79	30,900.00	5,870.53	5,870.53	5,870.53	5,870.53
Sonora	2024	U	6			247	710,807.00	719,330.20	300,000.00	46,092.24	44,026.23	44,026.23	43,186.23
Sonora	2024	U	6			231	168,036.50	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-
Sonora	2024	U	6			217	535,545.10	325,940.81	300,000.00	116,524.08	116,524.08	116,524.08	116,524.08
Sonora	2024	U	6			221	432,263.97	562,083.17	433,213.00	242,988.96	184,653.96	184,653.96	182,586.98
Sonora	2024	U	6			238	4,200.00	4,200.00	3,200.00	-	-	-	-
Sonora	2024	U	6			241	23,736.47	48,625.82	40,000.00	6,850.92	6,514.94	6,514.94	6,514.94
Sonora	2024	U	6			243	9,271.80	4,455.09	4,100.00	1,773.17	1,773.17	1,773.17	1,773.17
Sonora	2024	U	6			244	58,150.00	366,050.00	350,000.00	160,800.06	160,800.06	160,800.06	160,800.06

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Segundo Trimestre 2024 del Instituto Tecnológico de Sonora

Sonora	2024	U	6			245	56,000.00	22,255.40	20,000.00	1,273.83	1,273.83	1,273.83	1,273.83
Sonora	2024	U	6			246	2,146,219.17	1,938,511.56	1,583,500.00	194,476.18	180,245.32	180,245.32	159,491.46
Sonora	2024	U	6			248	1,259,552.25	1,526,858.18	958,936.00	283,598.66	240,964.02	240,964.02	240,351.66
Sonora	2024	U	6			233	-	9,918.00	9,918.00	-	-	-	-
Sonora	2024	U	6			249	497,849.80	1,617,114.11	800,900.00	50,976.68	37,717.18	37,717.18	34,353.07
Sonora	2024	U	6			215	625,400.00	651,659.90	330,000.00	644,834.00	644,834.00	644,834.00	644,834.00
Sonora	2024	U	6			216	946,473.94	1,941,928.04	800,000.00	90,025.82	52,786.43	52,786.43	49,830.15
Sonora	2024	U	6			214	951,838.74	932,373.11	900,000.00	485,432.50	483,032.50	483,032.50	471,003.93
Sonora	2024	U	6			212	-	13,100.00	13,000.00	3,097.20	3,097.20	3,097.20	3,097.20
Sonora	2024	U	6			211	1,597,519.87	1,865,349.09	980,835.41	712,106.99	395,688.29	395,688.29	368,270.88
Sonora	2024	U	6			121	21,815,283.50	21,660,243.00	21,000,000.00	9,753,249.30	9,712,476.05	9,712,476.05	9,712,476.05
Sonora	2024	U	6			122	129,425,204.00	112,839,088.80	12,150,000.00	112,817,966.00	60,610,536.08	60,610,536.08	60,610,536.08
Sonora	2024	U	6			131	51,687,824.00	50,112,123.13	16,360,543.76	50,066,920.18	23,407,690.54	23,407,690.54	23,407,690.54
Sonora	2024	U	6			132	22,356,398.00	43,259,490.01	23,125,000.00	43,259,490.01	40,899,701.31	40,899,701.31	40,899,701.31
Sonora	2024	U	6			134	9,765,259.00	9,621,506.00	3,250,000.00	9,621,506.00	4,855,242.20	4,855,242.20	4,855,242.20
Sonora	2024	U	6			137	29,494,815.00	29,285,175.00	18,158,000.00	29,285,175.00	14,102,988.74	14,102,988.74	14,102,988.74
Sonora	2024	U	6			141	6,583,236.00	14,888,627.00	8,323,008.00	9,890,786.75	3,275,198.00	3,275,198.00	3,275,198.00
Sonora	2024	U	6			142	6,813,486.00	6,813,871.75	5,134,000.00	6,803,997.60	3,280,290.09	3,280,290.09	3,280,290.09
Sonora	2024	U	6			143	18,256,303.00	17,681,368.06	1,330,000.00	8,783,628.73	8,701,784.43	8,701,784.43	8,701,784.43
Sonora	2024	U	6			154	22,238,881.87	20,953,932.46	1,391,870.00	20,953,932.46	10,462,437.18	10,462,437.18	10,462,437.18
Sonora	2018	S	247	-	-								
Sonora	2018	S	247			336	-	212.26	-	-	-	-	-
Sonora	2018	S	247			339	-	18,757.28	-	-	-	-	-
Sonora	2018	S	247			294	-	78.38	-	-	-	-	-
Sonora	2018	S	247			261	-	650.28	-	-	-	-	-
Sonora	2018	S	247			381	-	3,860.07	-	-	-	-	-
Sonora	2018	S	247			375	-	9,527.80	-	-	-	-	-
Sonora	2018	S	247			371	-	1,221.40	-	-	-	-	-
Sonora	2018	S	247			442	-	1,403.24	-	-	-	-	-
Sonora	2018	S	247			515	-	8,856.11	-	-	-	-	-
Sonora	2018	S	247			211	-	1,893.09	-	-	-	-	-

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Segundo Trimestre 2024 del Instituto Tecnológico de Sonora

Sonora	2018	S	247			214	-	330.90	-	-	-	-	-
Sonora	2018	S	247			511	-	6,188.11	-	-	-	-	-
Sonora	2019	S	247	-	-								
Sonora	2019	S	247			211	-	1,805.49	-	-	-	-	-
Sonora	2019	S	247			214	-	0.01	-	-	-	-	-
Sonora	2019	S	247			442	-	48,322.00	-	-	-	-	-
Sonora	2019	S	247			521	-	0.92	-	-	-	-	-
Sonora	2019	S	247			511	-	6,883.10	-	-	-	-	-
Sonora	2019	S	247			515	-	8,962.90	-	-	-	-	-
Sonora	2023	S	247	-	12,862.79								
Sonora	2023	S	247			442	-	4,481.68	-	4,481.68	4,481.68	4,481.68	4,481.68
Sonora	2023	S	247			515	-	3,308.30	-	3,308.30	3,308.30	3,308.30	3,308.30
Sonora	2023	S	247			294	-	5,250.00	-	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
Sonora	2023	I	8	-	36,423.00								
Sonora	2023	I	8			622	-	0.41	-	-	-	-	-
Sonora	2023	I	8	-	-								
Sonora	2023	I	8			622	-	0.36	-	-	-	-	-
Sonora	2023	I	8	-	87,451.44								
Sonora	2023	I	8			622	-	5,341,567.34	-	5,341,567.34	5,341,567.34	5,341,567.34	5,341,567.34

Destino del gasto Segundo Trimestre 2024 del Instituto Tecnológico de Sonora.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Segundo Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 09/07/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**DATOS DE LA UNIVERSIDAD**

ITSON
Educar para
Trascender

Nombre:	Instituto Tecnológico de Sonora
---------	---------------------------------

Entidad federativa: Sonora

Clave 911: 26MSU0023H

Nombre: Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Cargo: Directora de Planeación Institucional
Teléfono: 644 410 09 00 Ext. 2906 y 644 410 09 06 Directo
Correo electrónico: nríos@itson.edu.mx

RESPONSABLE

DATOS DEL AVANCE DEL PROY

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	ID de acuerdo con el SIFAM	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					Monto ejercido (D)	Remanente (E) =B-D	Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales		Observaciones	Reintegro a la TESOFE			Actas			
			Obras nuevas /reconstrucción	Obras de conservación	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento		Proyecto sustentable	No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)			Contratista	Monto no Contratado(C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B	Nombre del Espacio/equipo			Cantidad	Metros Cuadrados		Inicio	Término	Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega- Recepción (Acta finaliquito) MONTO	Fecha
								INICIO			TÉRMINO																			
1	1	Adecuaciones y Mejoras del Laboratorio LV-800, de Ciencias del Agua y Medio Ambiente, Unidad Obregón, Campus Náinari.				X			\$	7,100,000.00							Laboratorios	5	308.95	Se entregaron los expedientes técnicos de los proyectos autorizados para el ejercicio 2024 al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE). Se obtuvo el oficio de autorización presupuestal por el Gobierno del Estado y está por iniciar el procedimiento de contratación mediante licitación pública.	GLOBAL DEL PROYECTO									
2	2	Primera Etapa de Edificio de Laboratorios, Aulas y Cubículos, Unidad Guaymas, Campus Empalme.	X						\$	7,071,949.00							Laboratorios	4	277.01	Se entregaron los expedientes técnicos de los proyectos autorizados para el ejercicio 2024 al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE). Se obtuvo el oficio de autorización presupuestal por el Gobierno del Estado y está por iniciar el procedimiento de contratación mediante licitación pública.	GLOBAL DEL PROYECTO									
3	5	Adecuaciones y Mejoras del Edificio AM-600, Aulas, Laboratorios y Cubículos, Unidad Navojoa, Campus Sur.				X			\$	8,200,000.00							Aulas	4	299.60	Se entregaron los expedientes técnicos de los proyectos autorizados para el ejercicio 2024 al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE). Se obtuvo el oficio de autorización presupuestal por el Gobierno del Estado y está por iniciar el procedimiento de contratación mediante licitación pública.	GLOBAL DEL PROYECTO									
								\$22,371,949.00					\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00													

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Dr. Jesús Héctor Hernández López

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

Destino del gasto Segundo Trimestre 2024 del Instituto Tecnológico de Sonora.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Segundo Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 09/07/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

1


Nombre de la obra:

Adecuaciones y Mejoras del Laboratorio LV-900, de Ciencias del Agua y Medio Ambiente, Unidad Obregón, Campus Náinari.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

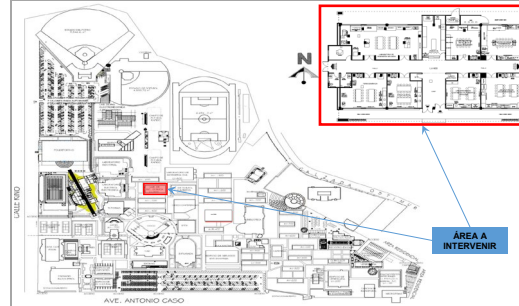

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Antonio Caso S/N esq. con Lateral Kino, Fraccionamiento Villa ITSON, C.P. 85130, Ciudad Obregón, Sonora, México.



ITSON
Educar para
Trascender

Porcentaje de avance

0.0%

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada Posterior

Observaciones :



F3: Vestibulo de acceso



F4: Laboratorio



F5: Pasillo interior

Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

Dra. Nidia Josefina Rios Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Dr. Jesús Hualter Hernández López
Rector

Destino del gasto Segundo Trimestre 2024 del Instituto Tecnológico de Sonora.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Segundo Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 09/07/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

1


Nombre de la obra:

Primera Etapa de Edificio de Laboratorios, Aulas y Cubículos, Unidad Guaymas, Campus Empalme.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

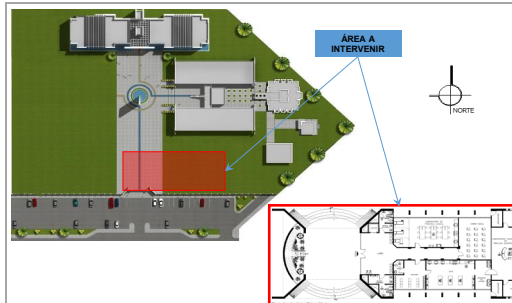

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

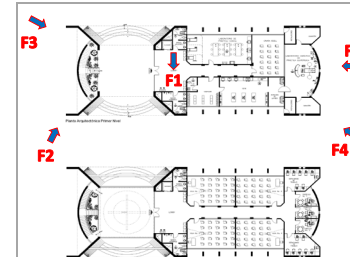

Dirección Postal: Carretera al Aeropuerto Km 3, C.P. 85400, Guaymas, Sonora, México.



ITSON
Educar para
Trascender

Porcentaje de avance

0.0%

FOTOS



F1:Foto Aerea Campus Empalme



F2: Terreno

Observaciones :



F3: Terreno



F4: Terreno



F5: Terreno

Rodrigo Tamayo Cuevas
Mtro. Rodrigo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

Nidia J. Ríos Vázquez
Dra. Nidia J. Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Jesús Héctor Hernández López
Dr. Jesús Héctor Hernández López
Revisor

Destino del gasto Segundo Trimestre 2024 del Instituto Tecnológico de Sonora.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Segundo Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 09/07/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

3


Nombre de la obra:

Adecuaciones y Mejoras del Edificio AM-600, Aulas, Laboratorios y Cubículos, Unidad Navojoa, Campus Sur.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

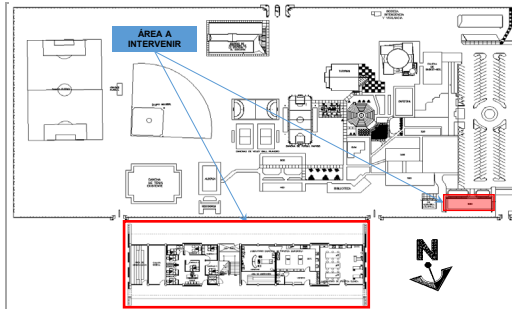

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Ramón Corona S/N esq. con Aguascalientes, Colonia ITSON, C.P. 85860, Navojoa, Sonora, México.



Educación para
Trascender

Porcentaje de avance

0.0%

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior

Observaciones :



F3: Interior Laboratorio



F4: Interior Cubículos



F5: Interior Aulas


Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo Cuevas
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales


Dra. Nidia Josefina Rios Vázquez
Directora de Planeación Institucional


Dr. Jesús Héctor Fernández López
Rector
